

令和6年度 静岡市公共事業評価委員会

【事後評価】防災・安全交付金
都市公園安全・安心対策推進のための公園整備計画

都市局都市計画部公園建設管理課
令和6年12月4日

目 次

- 社会資本総合整備計画概要
- 評価内容①要素事業の進捗
- 評価内容②評価指標の目標値の実現状況
- 評価内容③事業効果の発現状況
- 評価内容④今後の方針

社会資本総合整備計画概要

社会資本総合整備計画概要

■計画の名称

都市公園安全・安心対策推進のための公園整備計画

■計画の期間

令和2年度～令和5年度（4年間）


■全体事業費

586百万円

（基幹事業 4事業）

社会資本総合整備計画概要

■ 計画の目的

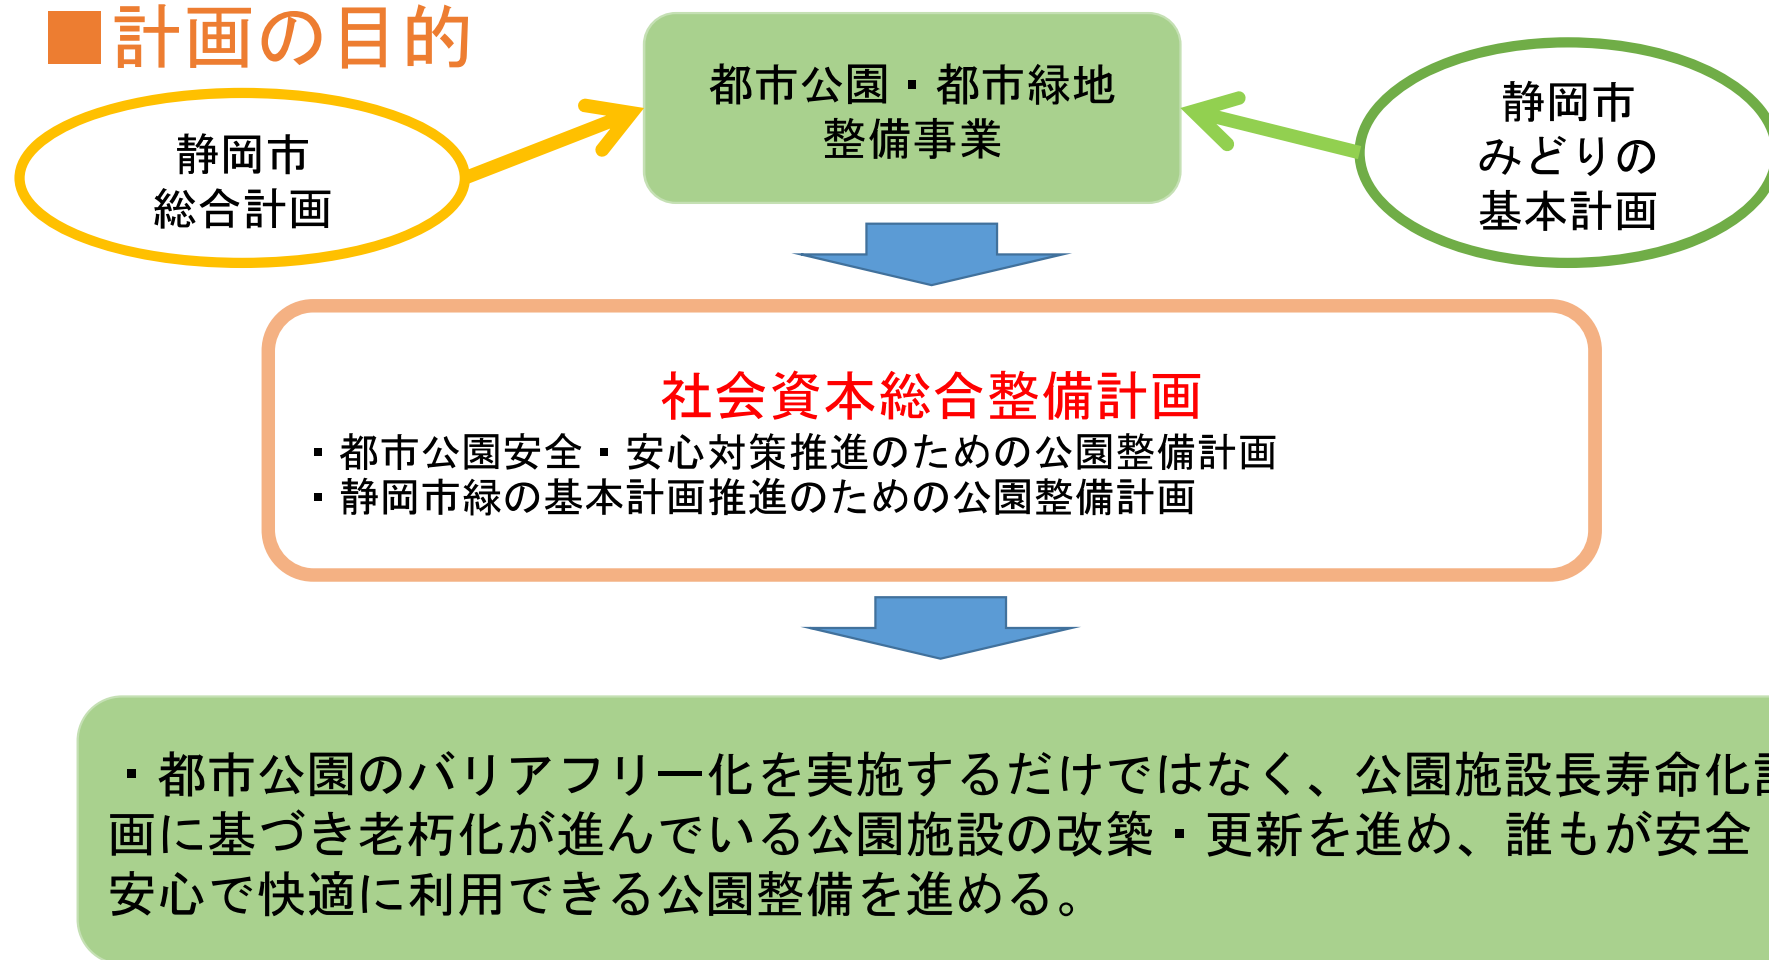

社会資本総合整備計画概要

■事業内容

区分	事業種別	番号	事業名称	
基幹事業	公園	A12-001	公園施設長寿命化対策支援事業（5 か年老朽）	継続
	公園	A12-002	公園施設長寿命化対策支援事業	継続
	公園	A12-003	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	継続
	公園	A12-004	公園施設長寿命化計画策定調査	完成

4 要素事業中 1 事業の整備が完成し、3 事業が継続である。

評価内容①要素事業の進捗状況

評価内容①要素事業の進捗状況

A12-001, 002

A 基幹事業 公園施設長寿命化対策支援事業の概要

事業 種別	事業箇所名	評価時計画			評価時の 完成状況
		計画内執行額 (百万円)	計画期間内の 進捗率 ※事業費ベース ※（ ）は実施施設率	事業内容	
		全体事業費 (百万円)			
公園	公園施設長寿命化 対策支援事業	436（158施設）	約 100% （約 100%）	公園施設（遊具等）の更 新整備	次期計画へ 継続
		436（158施設）			

※「静岡市公園施設長寿命化計画」H26～R5の10年間、対象施設1,006のうち、R2～5更新対象施設158

更新前

R 5 渋川中公園
複合遊具更新



完成



評価内容①要素事業の進捗状況

A12-003

A 基幹事業 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業の概要

事業 種別	事業箇所名	評価時計画			評価時の 完成状況
		計画内執行額 (百万円)	計画期間内の 進捗率 ※事業費ベース ※（ ）はバリアフ リー化達成率	事業内容	
		全体事業費 (百万円)			
公園	都市公園安全・安心 対策緊急総合支援事業	140	約 93.3% (約 73.3%)	公園施設（トイレ等）のバ リアフリー化	次期計画へ 継続
		150			

※バリアフリー化対象公園数 521公園のうち、R2～5年整備対象 9公園



R 4 高松汐入公園



R 4 有永公園

評価内容②
社会資本総合整備計画に記載した
評価指標の目標値の実現状況

評価内容②評価指標の目標値の実現状況

■成果目標の達成状況

指標：静岡市内の都市公園における長寿命化対策支援事業達成率

成果目標

都市公園における長寿命化対策支援事業を実施した施設数。

143施設(R1末**47.5%**) から **301施設**(R5末**100%**)に更新
(+ **158施設**)

計測方法

(R5末の実施施設数累計／R5末計画施設数累計) × 1 0 0

評価内容②評価指標の目標値の実現状況

■長寿命化達成率

令和元年度末実施済	143施設
令和5年度末目標値	301施設（+158施設）
令和5年度末実績値	301施設（+158施設）

達成率

（R5末の実施施設数累計／R5末計画施設数累計）×100

令和元年度末実施率 $143/301 \times 100 = 47.5\%$

令和5年度末目標値 $301/301 \times 100 = 100\%$

令和5年度末実績値 $301/301 \times 100 = 100\%$

成果：達成（52.5%増加）

※ H26～R5対象施設1,006施設：改築及び修繕等により長寿命化を完了

評価内容②評価指標の目標値の実現状況

■成果目標の達成状況

指標： 静岡市内の都市公園におけるバリアフリー化達成率

成果目標

都市公園におけるバリアフリー化の達成率。

目標値： **62.1%**(R 1 末) から **73.0%**(R 5 末)に増加 (+ **10.9%**)

計測方法

{ (園路及び広場の適合公園数／園路及び広場の設置公園数)
+ (駐車場の適合公園数／駐車場の設置公園数) + (便所の適合公園数／便所の設置公園数) }／ 3 × 1 0 0

評価内容②評価指標の目標値の実現状況

■バリアフリー化達成率

令和元年度末	園路広場：506の内381公園、	駐車場：20の内12公園、	便所：263の内134公園
令和5年度末目標値	園路広場：519の内400公園、	駐車場：21の内17公園、	便所：269の内164公園
令和5年度末実績値	園路広場：521の内403公園、	駐車場：21の内17公園、	便所：268の内165公園

達成率

園路及び広場 駐車場 便所

R 1 末 $\{(381/506) + (12/20) + (134/263)\} / 3 \times 100 = 62.1\%$

目標値 $\{(400/519) + (17/21) + (164/269)\} / 3 \times 100 = 73.0\%$

実績値 $\{(403/521) + (17/21) + (165/268)\} / 3 \times 100 = 73.3\%$

成果：達成（11.2%増加）

評価内容③事業効果の発現状況

評価内容③事業効果の発現状況

■定量的指標の現状値、目標値、発現状況、達成状況

	当初現況値	最終目標値	発現状況	達成状況
	R1 末	R5末		
都市公園における長寿命化対策支援事業を実施した施設数	47.5%	100%	100%	達成
都市公園におけるバリアフリー化を達成した公園数	62.1%	73.0%	73.3%	達成
公園施設長寿命化計画（令和6年度版）の策定	0%	100%	100%	達成

- ・本年度の施設事故は0件となっており、安全な公園施設利用を推進。
- ・施設点検や健全度診断結果を長寿命化計画に反映し、更新する優先順位を明確化。
- ・優先順位に基づき施設整備を実施し、施設の交換を効率化。
- ・ライフサイクルコストの縮減額が、概算で1,390万円の効果。

評価内容④今後の方針

評価内容④今後の方針

- ・ 静岡市公園施設長寿命化計画（令和 6 年度版）に基づき、計画的な改築・更新を実施する。



**誰もが安全・安心で快適に利用できるような
公園緑地整備を進める。**
