


写真帳(例)


浄化槽設置工事

施工場所:

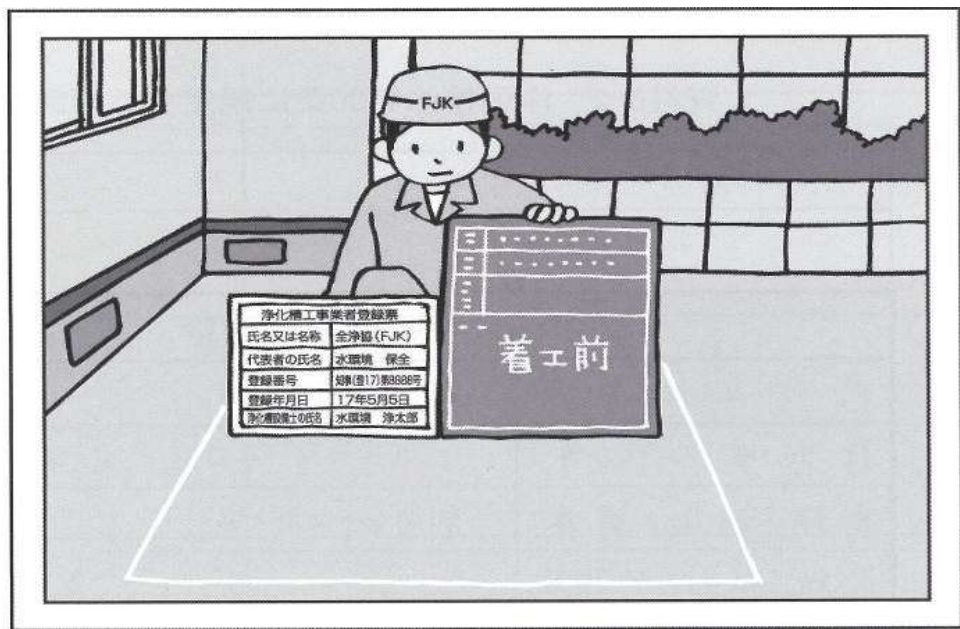

着手前

- ☐ 日付
- ☐ 設置場所全体
- ☐ 工事業者登録(届出済)票
- ☐ 施工場所(看板)
- ☐ 浄化槽設備士
(顔、文字が分かるように)

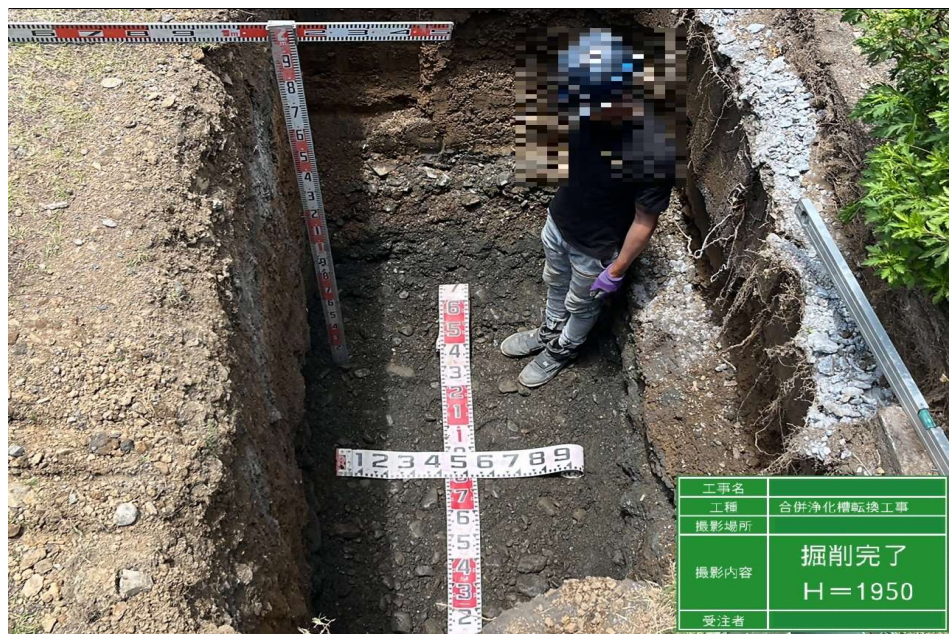

掘削

- ☐ 掘削後
- ☐ 土留状況
- ☐ スケールの数字がわかるように
- ☐ 掘削高さ(寸法)



砂利地業

- ☐ 転圧状況(転圧機とともに)
- ☐ スケール
- ☐ 寸法(厚さ)



基礎工事

・配筋状況

※異形鉄筋

(鉄筋コンクリート用棒鋼)




基礎工事

・コンクリート

☐ スケール

☐ 寸法(厚さ)

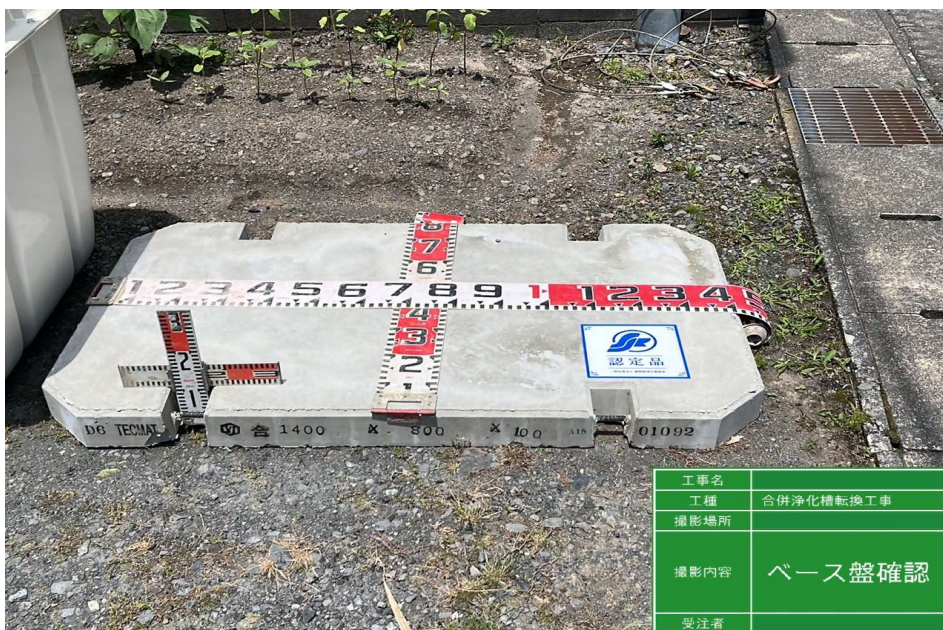

基礎工事

・既製コンクリート

設置前

☐ メーカー名

☐ スケール(寸法、板厚)

工事名	合併浄化槽転換工事
撮影場所	
撮影内容	ベース盤確認
受注者	



工事名	合併浄化槽転換工事
工種	合併浄化槽転換工事
撮影場所	
撮影内容	ベース盤水平確認
受注者	

基礎工事

・既製コンクリート

設置後


☐ 水平確認(縦・横)



工事名	合併浄化槽転換工事
工種	合併浄化槽転換工事
撮影場所	
撮影内容	本体確認
受注者	

浄化槽本体


☐ 型式、全体写真

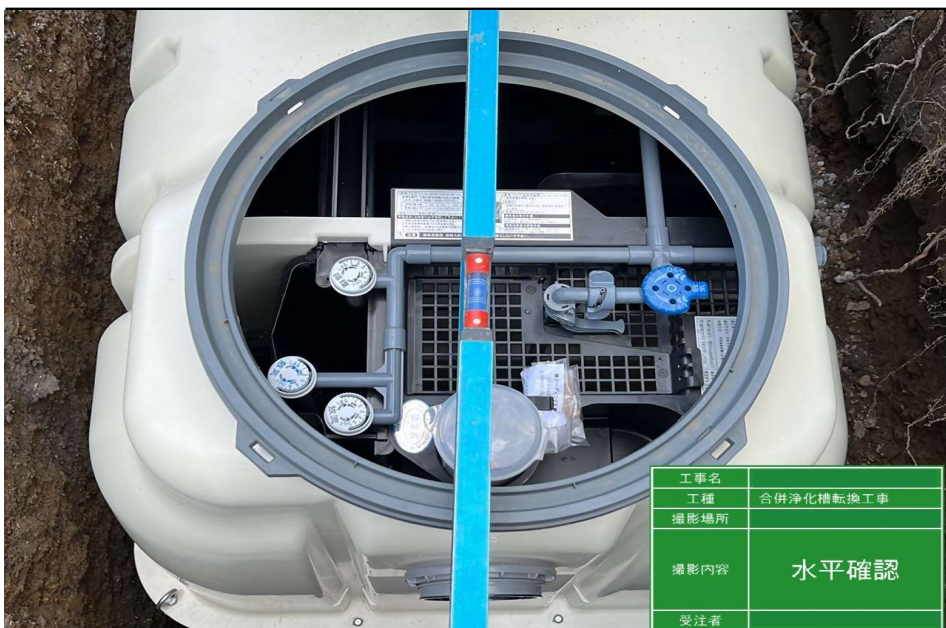

工事名	合併浄化槽転換工事
工種	合併浄化槽転換工事
撮影場所	
撮影内容	水平確認
受注者	

据え付け

☐ 水平確認(縦)

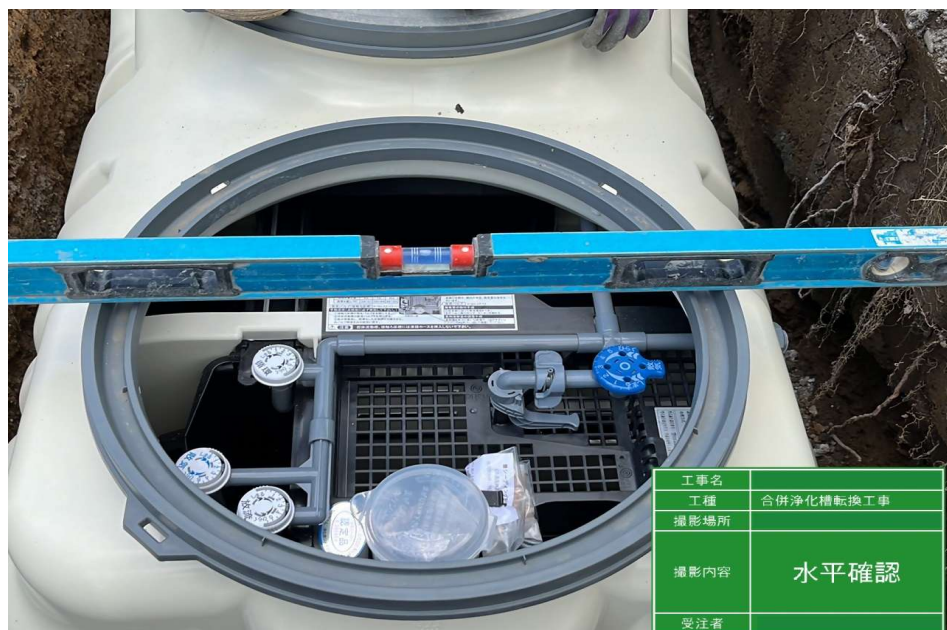

工事名	
工種	合併浄化槽転換工事
撮影場所	
撮影内容	水平確認
受注者	

据え付け

- ☐ 水平確認(横)



工事名	
工種	合併浄化槽転換工事
撮影場所	
撮影内容	水張り
受注者	

水張り

- ☐ ホース(放水と共)
- ☐ 24時間以上経過後の漏水確認



工事名	
工種	合併浄化槽転換工事
撮影場所	
撮影内容	中間水締め状況
受注者	

水締め


- ☐ ホース(放水と共)



工事名	
工種	合併浄化槽転換工事
撮影場所	
撮影内容	上部転圧
受注者	

埋め戻し

- ☐ 転圧状況(転圧機とともに)
- ☐ 良質土

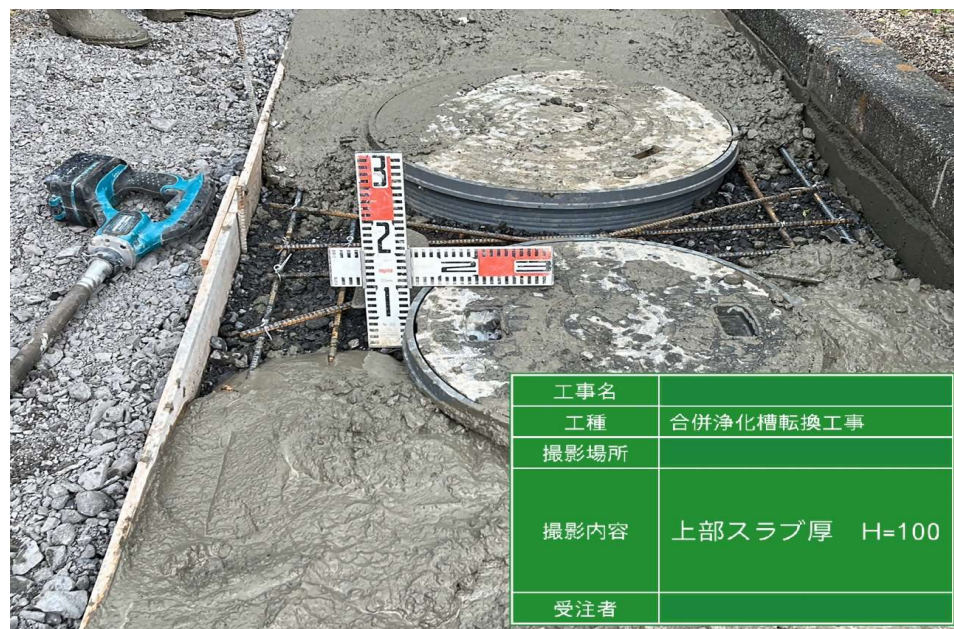

工事名	
工種	合併浄化槽転換工事
撮影場所	
撮影内容	上部スラブ厚 H=100
受注者	

スラブ

- ※異形鉄筋
(鉄筋コンクリート用棒鋼)
- ☐ 配筋状況
- ☐ スラブ厚
- ☐ スケール
- ☐ 寸法(高さ)



工事名	
工種	合併浄化槽転換工事
撮影場所	
撮影内容	嵩上げ300以下
受注者	

嵩上げ

- ☐ スケール
- ☐ 寸法(高さ)



工事名	
工種	合併浄化槽転換工事
撮影場所	
撮影内容	完成
受注者	

完成

- ☐ スラブ
- ☐ 日付



工事名	静岡市葵区 岩崎信男様邸
工種	合併浄化槽転換工事
撮影場所	静岡市葵区牛妻206-1
撮影内容	ブローア設置状況
受注者	Mizuma株式会社

ブローア

- ☐ 設置状況(固定)
- ☐ コンセント(防水)口が分かるように
- ☐ 必要に応じアース部分が分かるように
