

## 令和5年5月8日(月)静岡市(南部・北部)大雨に係る被害状況等報告

静岡市危機管理総室

1 対応期間 令和5年5月8日(月)3時42分～14時30分

### 2 雨量・警報

- (1) 雨量 市内最大累加降水量 6日20時～8日8時 静岡市北部 大川(国) 223mm  
1時間最大降水量 8日1時～2時 静岡市南部 能島 32mm  
※気象台アメダス累加降水量(駿河区曲金) 7日2時～8日7時 133mm

### (2) 警報等

| 日  | 時間    | 気象情報          | 市民への広報     |
|----|-------|---------------|------------|
| 8日 | 03:42 | 静岡市南部・北部 大雨警報 | 発表 同、メ、ラ、ポ |
| 〃  | 07:19 | 静岡市南部・北部 大雨警報 | 解除 メ、ポ     |

同：同報無線、メ：市民メール、ラ：防災ラジオ、ポ：防災情報ポータルサイト

3 職員配備状況 67人 総括部 5人、観光交流文化部 2人、経済部 4人、都市部 2人、  
(5月8日7:30時点) 建設部 35人、上下水道部 9人、葵区本部 1人、駿河区本部 5人、  
清水区本部 4人

4 避難情報 避難者 なし


### 5 被害状況 【別紙1】のとおり

- (1) 人的被害 …なし
- (2) 物的被害 …2件
- ・葵区横内町：非住家の壁面破損  
(5月8日：落下物撤去済、二次崩落の危険性があるため隣接道路を一時通行止。  
5月9日：安全措置実施に伴い、同日14時通行止め解除)
  - ・清水区横砂本町：横砂北公園内の樹木の倒木により隣接する民地の倉庫等が破損  
(5月8日：市都市計画事務所が倒木撤去及び倉庫等の応急措置を実施済)
- (3) 崩土 …なし
- (4) 河川被害 …1件 清水区押切：和田川支川大内水路の護岸崩落  
(護岸上部の民地駐車場の安全確保措置、崩落土砂等撤去済)
- (5) 道路被害 …2件 清水区(有度、庵原)：倒木  
(有度、庵原：倒木により一時通行止め。現在、通行止め解除)
- (6) 浸水被害 …1件 葵区日向：道路及び住家敷地の冠水  
(建物の浸水被害なし)

## 被害の詳細について

## 1 葵区日向に関する情報

- (1) 場所：葵区日向 能又川（よきまたかわ）付近  
違法盛土地点から直線 1.7km  
(違法盛土が流出した場合の想定ルート距離 2.1km)
- (2) 通報内容：5月8日7時 葵区本部 地域住民から受電  
受電内容「川の水が溢れ（結構）敷地内に流れてきている。」
- (3) 被害状況：冠水（林道、住家敷地）
- ・能又川が氾濫し、林道及び住家敷地の一部が冠水
  - ・建物に被害なし
- (4) 調査結果：5月11日に市河川課・治山林道課が溢水原因の詳細調査を実施  
→複数の斜面崩壊により、能又川の広い範囲で河床に堆積土砂及び倒木を確認。5月12日から業者による住家周辺の倒木撤去を開始  
→違法盛土の崩壊による河川への土砂流入の可能性は考えにくい。

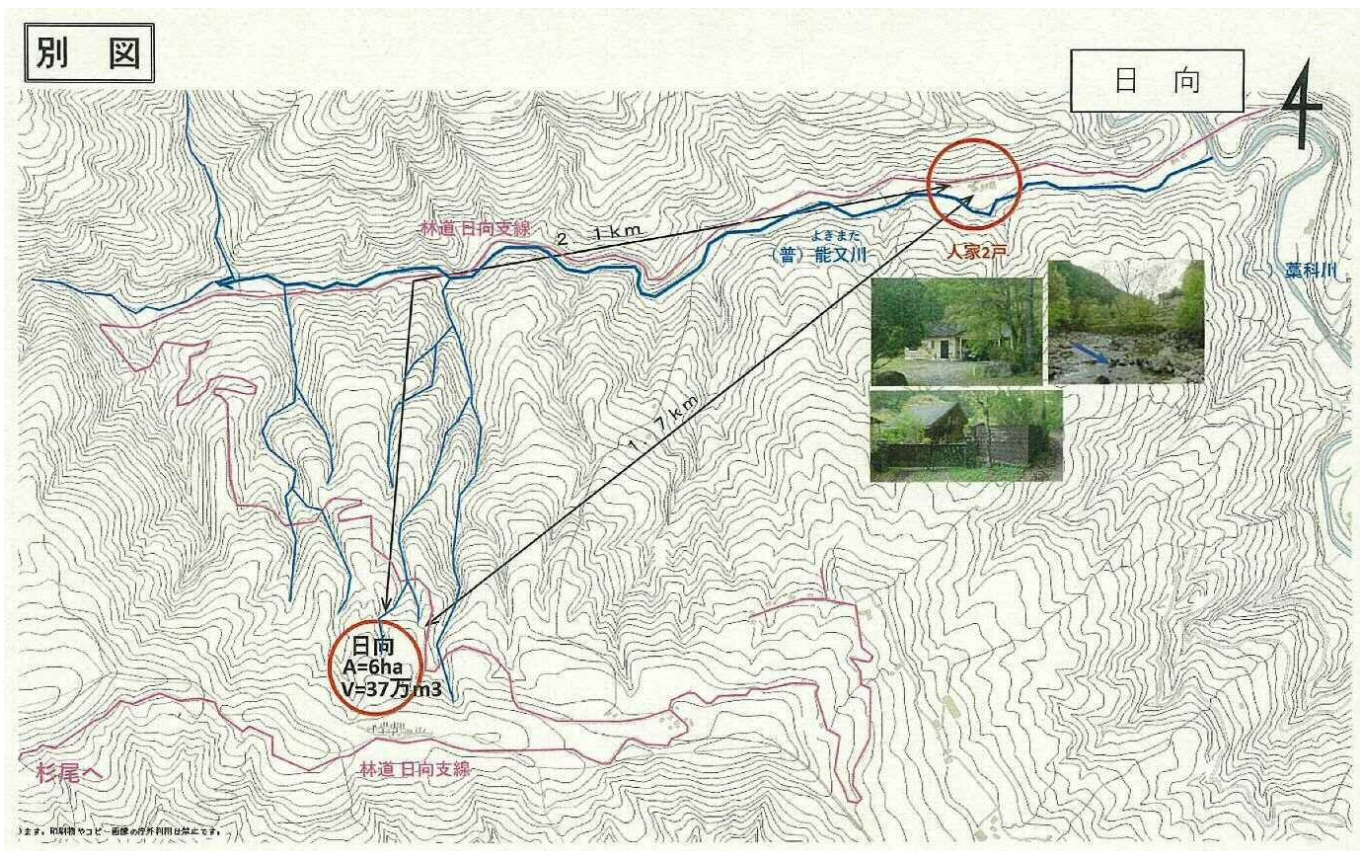

## 2 市内の違法盛土への対応状況

- ・市経済局で 13 箇所中 12 箇所（森林法及び農地法適用地）の状況を確認
  - 10 箇所について、新たな土砂の流出、盛土の崩落、湧き水等は確認されなかった。
  - 2 箇所（杉尾、日向）については、盛土表面の小崩落や排水口の日詰まりが確認されたため、5 月 9 日から造成事業者が復旧工事を開始。
    - （杉尾：5 月 9 日復旧工事完了）
    - （日向：5 月 18 日までに復旧工事完了予定）
- ・1 箇所（砂防指定地）について、県盛土対策課が確認
  - 土砂の流出、盛土の崩落、湧き水等は確認されなかった。

## 3 その他被害

### （1）物的被害：2 件（非住家）

- ・葵区横内町：非住家（空き家）壁面が破損し道路に散乱
  - ・5 月 8 日：市葵南道路整備課が落下物を撤去  
新たな落下の危険性があるため隣接道路を同日 17 時 30 分から通行止
  - ・5 月 9 日：建物の囲い込みによる安全措置を実施済、同日 14 時通行止め解除
- ・清水区横砂本町：横砂北公園内の樹木の倒木により隣接する民地の倉庫等が破損
  - 5 月 8 日：市都市計画事務所が倒木撤去及び倉庫等の応急措置を実施済

### （2）河川被害：1 件（護岸崩落）

- ・清水区押切：和田川支川大内水路の護岸崩落
  - ・護岸上部の民地駐車場は土地所有者が安全確保措置実施済  
(バリケード設置)
  - ・5 月 9 日：市土木事務所にて崩落土砂等撤去済
  - ・5 月 10 日：市土木事務所にて土嚢及びブルーシートによる応急措置実施済
  - ・復旧工事については後日実施予定

### （3）道路被害：2 件（倒木）

- ・清水区（有度）：倒木撤去済  
(倒木により一時通行止め。現在、通行止め解除)
- ・清水区（庵原）：倒木撤去済  
(倒木により一時通行止め。現在、通行止め解除)
