

災害復旧の進捗状況について

- ・ 道路・河川 … 1P
- ・ 農道・林道・治山関係 … 4P
- ・ 市立スポーツ施設 … 8P
- ・ 保健福祉センター … 9P
- ・ 市立こども園 … 10P
- ・ 市立小中学校 … 11P
- ・ 市立図書館 … 12P

被害・復旧状況【令和5年3月27日現在】

◆道路

(箇所)

		葵区		駿河区	清水区	計
		葵南道路 整備課	葵北道路 整備課	駿河道路 整備課	清水道路 整備課	
被害箇所数		357	126	127	574	1,184
(うち、公共災害)		18	12	1	28	59
内 訳	法面崩壊	36	5	4	80	125
	路肩崩壊	31	15	4	89	139
	倒木	14	6	3	27	50
	土砂堆積	276	100	116	378	870
復旧完了数		333	114	124	539	1,110
R5年度復旧予定		8	10	3	28	49
R6年度以降復旧予定		16	2	0	7	25

※来年度以降復旧予定の箇所についても交通確保などの応急対応は行っており、R5復旧予定49箇所のうち25箇所とR6以降復旧予定25箇所のうち4箇所の計29箇所については本復旧工事をR4年度内に発注済。残りの箇所についてもR5早期の工事発注や修繕対応に向けて作業を進めています。

◆河川

(箇所)

		葵区	駿河区	清水区	計
		河川課	河川課	土木事務所	
被害箇所数		471	72	333	876
(うち、公共災害)		33	1	12	46
内 訳	土砂堆積	342	55	188	585
	法面・護岸崩壊	43	3	80	126
	その他	86	14	65	165
復旧完了数		391	66	277	734
R5年度復旧予定		80	6	56	142

※来年度復旧予定の箇所についても河道確保などの応急対応は行っており、R5復旧予定142箇所のうち83箇所については本復旧工事や修繕をR4年度内に発注済。残りの箇所についてもR5早期の工事発注や修繕対応に向けて作業を進めています。

◆道路

令和4年9月 台風15号による主な被害状況（道路）

令和5年3月27日現在



◆河川

令和4年9月 台風15号による主な被害状況（河川）

令和5年3月27日現在



被害状況

- ◆農道
 - ・農道1,621路線のうち、328路線で崩土・倒木・路肩欠損等が発生。
- ◆農業用水路
 - ・用水路45箇所で土砂堆積等が発生。

復旧状況 【令和5年3月27日現在】

- ◆農道
 - ・被害のあった農道328路線については、197路線の崩土撤去等が終了し、通行可能な状況。残り131路線については、順次復旧作業中。

被害件数(路線)	復旧済み(路線)	R5年度復旧予定(路線)
328	197	131

- ◆農業用水路
 - ・被害のあった用水路45箇所については、8箇所復旧完了。残り37箇所については、順次復旧作業中。


被害件数(箇所)	復旧済み(箇所)	R5年度復旧予定(箇所)
45	8	37

・国の公共災害復旧事業は、農道11路線で15箇所、農業用水路1箇所であり、全16箇所については、比較的小規模な工事3箇所を年度内に契約予定であり、残り13箇所についても順次契約を締結し、来年度末までに復旧工事の完了を見込んでいる。

農道関係

経済局
(農地整備課)

令和4年9月 台風15号被災箇所の復旧状況(農業用施設)

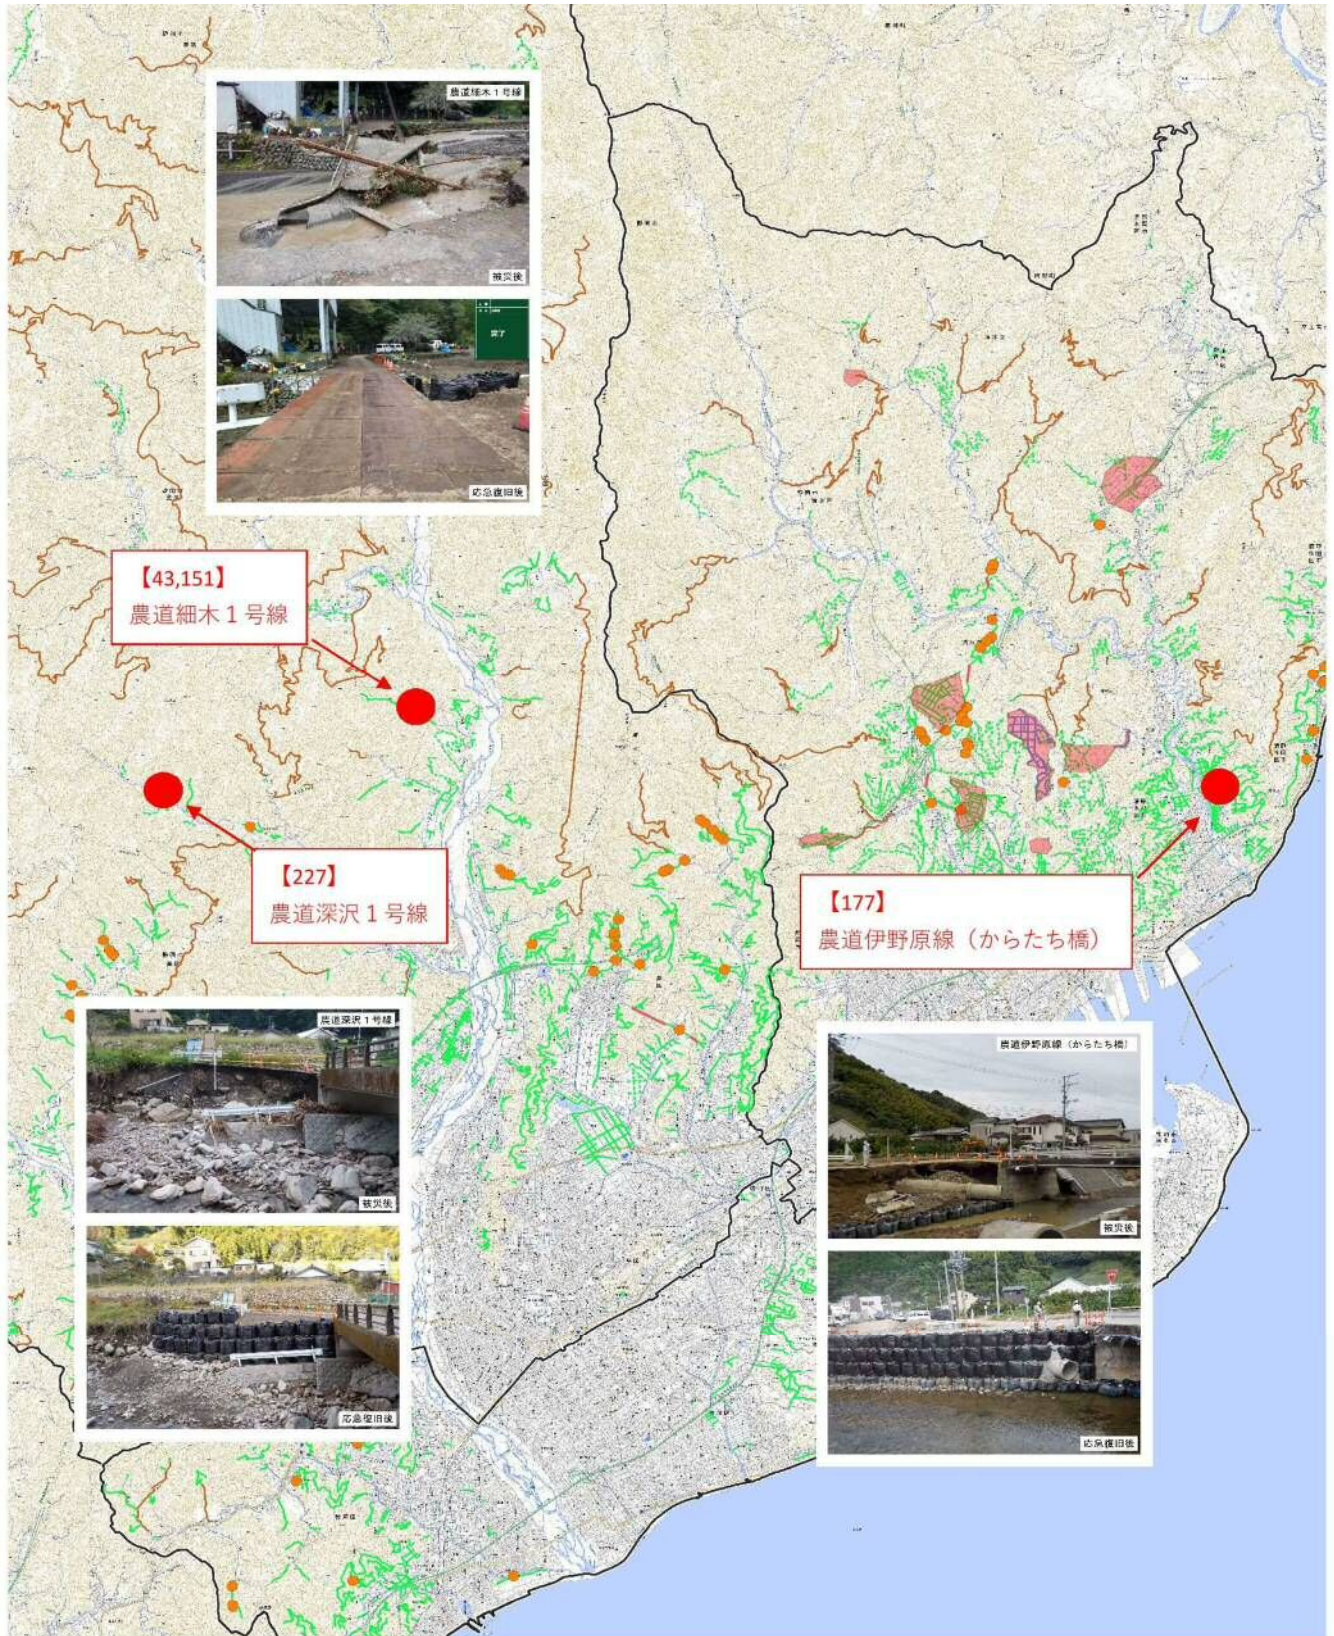

被害状況

◆林道

・林道161路線のうち、115路線で崩土・倒木・路肩欠損等が発生。

◆治山施設

・治山施設35箇所で土砂堆積等が発生。

復旧状況【令和5年3月27日現在】

◆林道

・被害のあった林道115路線については、50路線の崩土撤去等が終了し、通行可能な状況。残り65路線については、順次復旧作業中。

・国の公共災害復旧事業の8箇所については、3箇所です請負業者が決定しており、残り5箇所についても順次契約を締結し、来年度末までに復旧工事の完了を見込んでいる。

被害件数(路線)	復旧済み(路線)	R5年度復旧予定(路線)
115	50	65

◆治山施設

・治山施設における土砂撤去等は、35箇所中30箇所が完了。残り5箇所については4月末までの完了を見込んでいる。

被害件数(箇所)	復旧済み(箇所)	R5年4月末復旧予定(箇所)
35	30	5

林道・治山関係

経済局
(治山林道課)

令和4年9月 台風15号被災箇所への復旧状況 (治山林道課)



市立スポーツ施設 (スポーツ広場・グラウンド含む)

観光交流文化局
(スポーツ振興課)

主な施設の被害状況

- ・安倍川河川敷スポーツ広場のうち、19箇所のスポーツ広場で冠水し、グラウンドの陥没、土砂及び倒木の堆積が発生。サッカーゴール等の工作物も多数被害を受け、施設が利用不能となった。
- ・西ヶ谷総合運動場において、野球場及びテニスコートが冠水し、人工芝に隆起や剥がれが発生し、利用不能となった。また野球場では事務所等室内床上浸水や土砂流入し、電気設備等が水没、利用不能となった。
- ・その他、8施設で被害発生。清水長崎新田スポーツ広場他7施設において、電気系の故障や土砂流入被害が発生。由比川河川敷スポーツ広場において護岸が損傷したことにより、護岸上のジョギングコースが利用不能となった。



西ヶ谷野球場



西ヶ谷野球場

主な施設の復旧状況 【令和5年3月27日現在】

◆安倍川河川敷スポーツ広場

- ・被害が軽微であった3箇所は、直営作業により復旧。残り16箇所のうち、3箇所は令和5年2月に復旧済み、1箇所は3月末に復旧予定であり、残り12箇所は同年5月から8月頃の復旧を見込んでいる。



施行前



施行後

◆西ヶ谷総合運動場

- ・テニスコートは休場し、人工芝張替えを実施。修繕は完了し、令和5年1月20日から利用再開済。
- ・野球場は休場し、建物内の清掃等を実施中。今後、人工芝張替え、電気設備修繕等を実施し、令和5年10月末の完全復旧を見込んでいる。

- ◆その他、8施設のうち清水長崎新田スポーツ広場等7施設については復旧済。由比川河川敷スポーツ広場ジョギングコースは、令和5年度に復旧修繕を実施する。

(全体被害状況)

被害件数(件)	復旧済み(件)	R5年度復旧予定(件)
28	14	14

被害状況

- ・清水保健福祉センターにおいて、風雨及び近隣の河川氾濫により建物内部が床上浸水し、1階床が変色、腐食及び膨張変形等した。
- ・藁科保健福祉センターにおいて、床上浸水・排水管逆流によるトイレの浸水被害があった。



清水保健福祉センター



藁科保健福祉センター

復旧状況 【令和5年3月27日現在】

- ◆清水保健福祉センター
 - ・休館はせずに、建物内の床面洗浄及び消毒作業を実施。被害を受けた床板は、令和5年1月～3月に修繕を完了した。
 - ・令和5年度当初実施する災害復旧費国庫補助協議の現地査定結果に基づき、補助金請求を行う予定。
- ◆藁科保健福祉センター
 - ・休館はせずに、建物内の床面洗浄及び消毒等作業を実施。破損したOAフロアコンセントや内装は10月末までに修繕を完了した。



清水保健福祉センター



藁科保健福祉センター

被害件数(件)	復旧済み(件)	R5年度復旧予定(件)
2	2	0

被害状況

・市立こども園2園において、床上浸水が発生し、床・壁等が被害を受けた。



復旧状況【令和5年3月27日現在】

・園舎の消毒作業を実施の上、現在は2園とも通常どおり園児を受入れをしているが、将来的に浸水部分の床のそりによる園児の怪我やカビの発生による健康被害及び断熱材の吸水による断熱効果の低減といった影響が及ぶ可能性があることから、今後床・壁材の張替え、床下等浸水箇所の消毒、断熱材の交換等を行う。

被害件数(件)	復旧済み(件)	R5年度復旧予定(件)
2	0	2

被害状況

・市立小学校14校、市立中学校5校において、敷地内への土砂の流入、建物の浸水、建物の汚染や備品の破損、所蔵品の水没等の被害があった。



復旧状況 【令和5年3月27日現在】


・浸水被害のあった19校は、土砂の撤去、建物内の清掃及び消毒作業、備品の買替え等を実施。現在は、建物の床や設備の修繕を順次実施している。学校は、全て利用再開している。



被害件数(校)	復旧済み(校)	R5年度復旧予定(校)
19	16	3

被害状況

・市立南部図書館地階が浸水し、電動書架やエレベータの破損、約2万冊の図書・雑誌・新聞等の水没被害があった。



南部図書館被害状況

復旧状況 【令和5年3月27日現在】

- ・浸水被害のあった南部図書館は休館し、建物内の清掃及び消毒作業を実施。令和4年9月30日から開館している。
- ・破損したエレベータは修繕が完了し、令和5年1月26日から利用を再開した。
- ・破損した電動書架は現在取替修繕を開始し、令和5年11月末までに修繕完了及び利用再開を見込んでいる。
- ・水没した資料は必要に応じて順次買い替えを実施している。

南部電動書架修繕の様子
(水害を免れた資料の移送完了)



被害件数(件)	復旧済み(件)	R5年度復旧予定(件)
2(エレベータ・電動書架)	1(エレベータ)	1(電動書架)
